

DBP. 252.01. 2023

ZAKŁAD OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
"ASTRA" s.c.
49-300 Brzeg, ul. Towarowa 6
NIP: 747-16-96-619
Tel.: 77 4163256, kom. 728 347 663
www.gasnice-astra.pl
email: biuro@gasnice-astra.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” Im. Stanisława Hadyny
KANCELARIA 25. MAJ. 2023
Wpłynęło dnia:
L. dz.: 3537/2023
Ilość zał.:
Podpis: *Łeba*

PROTOKÓŁ BADANIA

NUMER: 1/2023

Typ: instalacja hydrantowa DN25/33/52

Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY
IM. STANISŁAWA HADYNY
UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN

Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK

Data wykonania badania: 2023-03-30
Data następnego badania: 2024-03-29

I. INFORMACJE OGÓLNE

Badania wykonano w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budowli i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),
- PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w rurociągi,
- Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa",
- Polska Norma PN-EN 671-1:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym",
- Polska Norma PN-EN 671-2:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z węzłem płasko składanym",
- PN-EN 14540:2014-11 wersja angielska, Węże pożarnicze -- Węże nieprzeziąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych
- Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z węzłem płasko składanym",

II. WYMAGANIA NORMOWE

Ciśnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być mniejsze niż 0,2 MPa.

Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych

Obowiązują następujące wartości wydajności nominalne hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody:

- hydrantu wewnętrznego 52 - $2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$
- hydrantu wewnętrznego 33 - $1,5 \text{ dm}^3/\text{s}$
- hydrantu wewnętrznego 25 - $1,0 \text{ dm}^3/\text{s}$
- zaworu hydrantowego 52 - $2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$

III.METODYKA POMIARÓW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowała:

- oględziny zewnętrzne instalacji,
- sprawdzenie wymiarów przy pomocy przyrządów pomiarowych,
- sprawdzenie podłączenia węża przy pomocy klucza do łącznika,
- pomiar ciśnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy tzw. "zerowym wypływie",
- pomiar ciśnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy,
- określenie wydajności hydrantu przeprowadzonego metodą analityczną, wykorzystując do tego wzór $Q = k \cdot \sqrt{H}$, gdzie:
 - Q - Natężenie wypływu [dm^3/min]
 - H - ciśnienie dynamiczne [Bar]
 - k - współczynnik dyszy wg. normy
- (dotyczy wewnętrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch najniekorzystniej położonych pod względem hydraulicznym punktów na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej (PN-EN 1074-6:2009)

W czasie pomiaru dokonano odczytu ciśnienia statycznego przy zamkniętym zaworze kulowym i ciśnienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.

IV. WYNIKI POMIARÓW HYDRANT NR 1


Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. STANISŁAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN
Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK

OPIS / LOKALIZACJA

Parter

HYDRANT	DYSZA	CIŚNIENIE STATYCZNE (MPa)	CIŚNIENIE DYNAMICZNE (MPa)	WYDAJNOŚĆ (l/s)
25	10	0,36	0,28	1,34

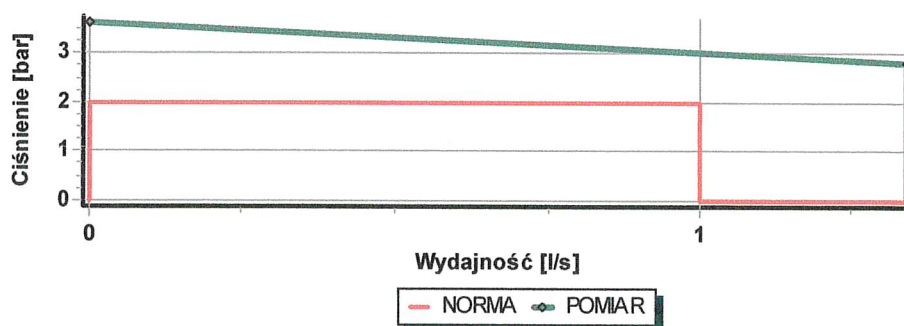

UWAGI

Próba węża pozytywna

IV. WYNIKI POMIARÓW HYDRANT NR 2


Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. STANISŁAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN
Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK

OPIS / LOKALIZACJA

I Piętro

HYDRANT	DYSZA	CIŚNIENIE STATYCZNE (MPa)	CIŚNIENIE DYNAMICZNE (MPa)	WYDAJNOŚĆ (l/s)
25	10	0,35	0,27	1,31

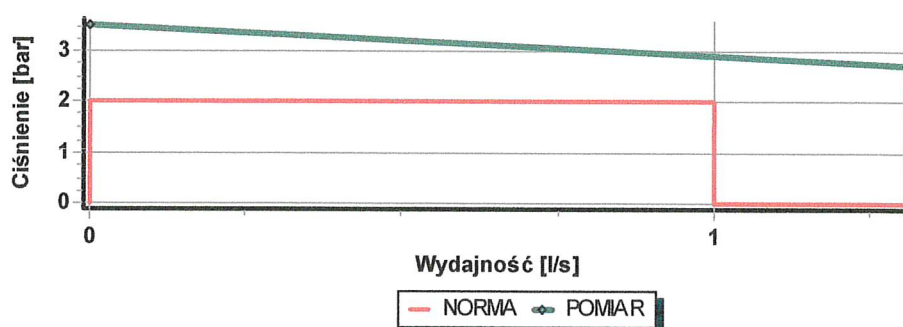

UWAGI

Próba węża pozytywna

IV. WYNIKI POMIARÓW HYDRANT NR 3


Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. STANISŁAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN
Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK

OPIS / LOKALIZACJA

poddasze

HYDRANT	DYSZA	CIŚNIENIE STATYCZNE (MPa)	CIŚNIENIE DYNAMICZNE (MPa)	WYDAJNOŚĆ (l/s)
25	10	0,33	0,25	1,26

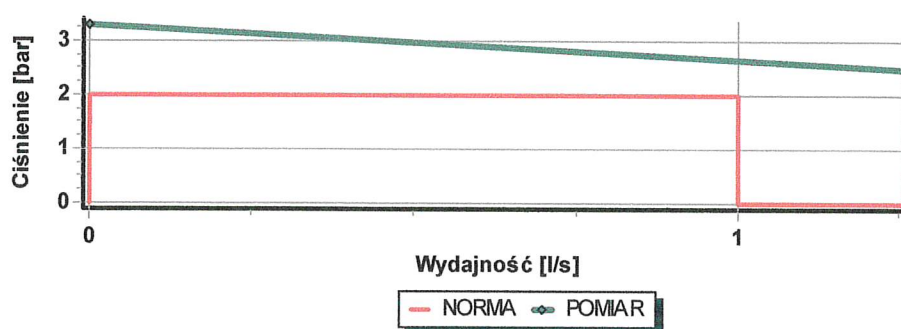

UWAGI

Próba węża pozytywna

IV. WYNIKI POMIARÓW HYDRANT NR 4


Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN
Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK

OPIS / LOKALIZACJA

poddasze

HYDRANT	DYSZA	CIŚNIENIE STATYCZNE (MPa)	CIŚNIENIE DYNAMICZNE (MPa)	WYDAJNOŚĆ (l/s)
25	10	0,33	0,25	1,26

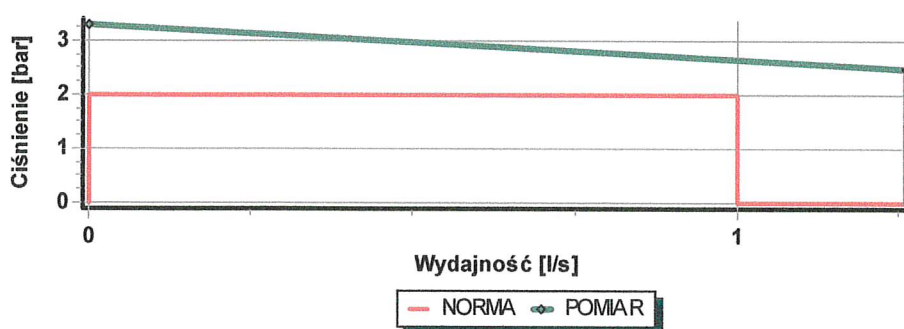

UWAGI

Próba węża pozytywna

V. WNIOSKI

- Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu **SPEŁNIA** wymagania norm i przepisów wskazanych w punkcie I niniejszego protokołu.
- Wartość ciśnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi 0,25 MPa przy wartości normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci określa się jako dobre.
- Wartość wydajności wodnej z hydrantu wewnętrznego przy dyszy 10 mm wynosi 1,26 litra/s, przy wartości normowej 1,00 litra/s zatem parametry techniczne określa się jako dobre.

· · Przeprowadzono badanie 4 hydrantów.

Zbadano wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch najmniejkorzystnie położonych pod względem hydraulicznym punktów na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej.

VI. UWAGI I ZALECENIA

INSPEKTOR
Ochrony Przeciwpożarowej

Marcin Wilk
Nr SIOPA/1/2021/1/2

INSPEKTOR
Ochrony Przeciwpożarowej
Dominika Wilk
Nr SIOP/1/2021/4/4

Wilk

Data wykonania badania: 2023-03-30
Data następnego badania: 2024-03-29

PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ WĘŻY HYDRANTOWYCH

Wykonawca
Zakład Ochrony Przeciwpożarowej "ASTRA" s.c.
Towarowa 6
49-300 Brzeg

Zleceniodawca:
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA " ŚLĄSK" IM. STANISŁAWA HADYNY, UL. ZAMKOWA 3
42-286 KOSZĘCIN

Adres wykonania:
PAŁAC ŁĄCZNIK,

LP.	HYDRANT	CIŚNIENIE PRÓBNE (MPa)	DATA PRODUKCJI WEŻA	DATA BADANIA WEŻA	DATA NASTĘPNEGO BADANIA	WYNIK PRÓBY
1.	25	1,20		2023-03-30	2028-03-30	SPEŁNIA
Próba węża pozytywna				Parter		
2.	25	1,20		2023-03-30	2028-03-30	SPEŁNIA
Próba węża pozytywna				I Piętro		
3.	25	1,20		2023-03-30	2028-03-30	SPEŁNIA
Próba węża pozytywna				poddasze		
4.	25	1,20		2023-03-30	2028-03-30	SPEŁNIA
Próba węża pozytywna				poddasze		

INSPEKTOR
Ochrony Przeciwpożarowej

Marcin Wilk
Nr SIOPA/1/2021/1/2
